ALUMINIUM MÉCANO-VISSÉ • CONTEMPORAIN

FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

EXPÉDITEUR

DATE DE RÉCEPTION

DATE DE RENVOI

FLUVIALE **PORTILLONS**

Nº CDE:

Société :

Adresse Livraison :

ATTENTION LIVRAISON ☐ SUR CHANTIER **129€** DE PORT

☐ **DEMANDE DE PRIX** ☐ **CONFIRMATION DE COMMANDE**

RÉF CLIENT _____

DÉLAIS _____ **SEMAINES**
(aprés réception de la confirmation de commande et des plans avec votre BON POUR ACCORD)
TRANSPORT PAR SEMI-REMORQUE (**ATTENTION À L'ACCESSIBILITÉ**)

PRIX NET _____

MODÈLE _____ **FORME** A

COULEUR RAL _____ ☐ TEXTURÉ ☐ MAT

RAL _____ ☐ BICOLOR

FORMES

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

DIMENSIONS

LARGEUR ENTRE PILIERS (sans jeu)	**L**	mm
HAUTEUR DES PILIERS (sous chapeaux)	**H1**	mm
HAUTEUR AU MONTANT (hors gond)	**H2**	mm
HAUTEUR A LA FLÈCHE — VALEUR DE LA FLÈCHE: +/- 60 mm	**H3**	mm

HAUTEUR AU GOND +/- 60 mm

OPTIONS

- ☐ SERRURE ET POIGNÉE ☐ SANS SERRURE ET POIGNÉE
- ☐ GÂCHE ELÉCTRIQUE A ENCASTRÉE
- ☐ PROFIL DE RÉCEPTION GÂCHE
- ☐ ARRÉT AVEC BLOCAGE ☐ À SCELLER ☐ À VISSER
- ☐ BUTÉES D'ARRÊT ☐ À SCELLER ☐ À VISSER
- ☐ LAMES A 45° (fougère) ☐ Partie Basse ☐ Partie Haute
- ☐ LAMES HORIZONTALES - Partie Basse
- ☐ BARREAUX HORIZONTAUX - Partie Haute LISSES: ☐ 2 ☐ 3
- ☐ LAMES (100x20) ☐ LAMES (150x20)
- ☐ LAMES LARGES (200x20) ☐ LAMES EXTRA-LARGES (300x20)
- ☐ LAMES BRISE-VUE SIMPLES ☐ LAMES «Z» PERSIENNÉES
- ☐ MONTAGE DES LAMES ☐ Horizontales ☐ Verticales
- ☐ RÉGLETTES 20mm (entre les lames de 200) RAL STANDARD _____
- ☐ DÉCOR TÔLE Aluminium (VAR) MOTIF Réf: ARBUSTE
- ☐ DÉCOR EXTÉRIEUR ☐ DÉCOR INTÉRIEUR Identique
- ☐ DÉCOUPE LASER Simple de la Tôle MOTIF Réf: ARBUSTE
- ☐ DÉCOUPE LASER Double (avec acrylique blanc)
- ☐ DÉCOUPE LASER Double (avec tôle dune autre couleur) RAL STANDARD _____
- ☐ NUMÉRO DE DOMICILE ☐ AUTRES MOTIFS RÉF _____
- ☐ TOTEM AVEC BOÎTE AUX LETTRES ☐ TOTEM AVEC RESERVATION B.A.L.
- ☐ TOTEM AVEC BOITE À COLIS CONNECTÉE

OBSERVATIONS

BON POUR ACCORD


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LUES ET ACCEPTÉES

Signature / Tampon:

OPTIONS 2


SENS D'OUVERTURE (vue ext)

☐ POUSSANT DROIT




☐ TIRANT DROIT

☐ POUSSANT GAUCHE



☐ TIRANT GAUCHE

POSE STANDARD

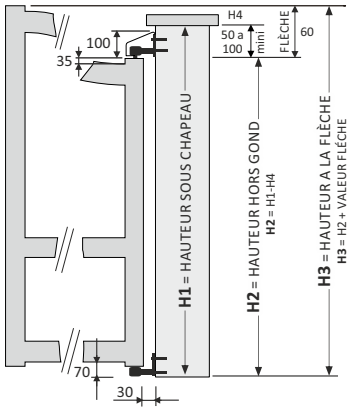

TYPE DE POSE

- ☐ 90º ENTRE PILIERS **(STANDARD)** ☐ OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
- ☐ OUVERTURE SUR PENTE (DÉNIVELÉ PAR ML) ____%
- ☐ 180º ARRIÈRE PILIERS ☐ 180º ENTRE PILIERS
- ☐ MONTAGE SUR PAUMELLES

FIXATION

- ☐ GONDS AVEC CACHE **(STANDARD)**
- ☐ GOND OBTURATEUR DU JOUR, POUR PORTAIL PLEIN **(STANDARD)**
- ☐ GONDS MULTIRÉGLAGE À VISSER HAUT ET BAS
- ☐ GONDS À SCELLER HAUT ET BAS
- ☐ CRAPAUDINE À VISSER AU SOL
- ☐ GONDS 3 POINTS À VISSER HAUT ET BAS
- ☐ GONDS HAUTS AVEC CACHE-GONDS

NB. DE POTEAUX (AVEC GONDS MONTÉS) à sceller

- QT: _____ 100x100 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
- QT: _____ 150x150 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
- QT: _____ 200x200 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
- QT: _____ PLATINE À VISSER POUR POTEAU 200x200 / 150x150
- QT: _____ TRAPPES DE VISITE

ATTENTION : mise en fabrication et délai applicable à partir du retour du présent document (et des plans) dûment complétés et signés.
NOTE 1 : en cas de changement d'adresse pour le déchargement, la commande pourrait être livrée ultérieurement, après l'initiation de la production.
Prix valables 15 jours. Si BPA après ce délai, les prix seront actualisés selon les hausses annoncées.
