ALUMINIUM ASSEMBLÉ VISSÉ • CONTEMPORAIN

FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

EXPÉDITEUR

DATE DE RÉCEPTION

DATE DE RENVOI


VILLAGE


PORTILLONS

Nº CDE:

Société :

Adresse Livraison :

ATTENTION LIVRAISON ☐ SUR CHANTIER **129€** DE PORT

☐ **DEMANDE DE PRIX** ☐ **CONFIRMATION DE COMMANDE**

RÉF CLIENT _____


DÉLAIS _____ **SEMAINES**
(aprés réception de la confirmation de commande et des plans avec votre BON POUR ACCORD)
TRANSPORT PAR SEMI-REMORQUE (**ATTENTION À L'ACCESSIBILITÉ**)

PRIX NET _____

MODÈLE _____ **FORME** A ▾

COULEUR RAL _____ ☐ TEXTURÉ ☐ MAT

FORMES



Modèles **DESIGN** (FORME **A**) UNIQUEMENT

	DIMENSIONS	
LARGEUR ENTRE PILIERS (sans jeu)	**L**	mm
HAUTEUR DES PILIERS (sous chapeaux)	**H1**	mm
HAUTEUR AU MONTANT (hors gond)	**H2**	mm
HAUTEUR A LA FLÈCHE — VALEUR DE LA FLÈCHE: +/- 60 mm	**H3**	mm

HAUTEUR AU GOND +/- 60 mm

OPTIONS

☐ SERRURE ET POIGNÉE ☐ SANS SERRURE ET POIGNÉE
☐ GÂCHE ELÉCTRIQUE A ENCASTRÉE
☐ PROFIL DE RÉCEPTION GÂCHE

☐ ARRÊT AVEC BLOCAGE ☐ À SCELLER ☐ À VISSER
☐ BUTÉES D'ARRÊT ☐ À SCELLER ☐ À VISSER
☐ CACHE JEU ENTRE MONTANT ET PILIER

☐ LAMES A 45° (fougère) ☐ Partie Basse ☐ Partie Haute
☐ LAMES (100x20) ☐ LAMES (150x20)
☐ LAMES LARGES (200x20) ☐ LAMES EXTRA-LARGES (300x20)
☐ LAMES BRISE-VUE SIMPLES ☐ LAMES «Z» PERSIENNÉES
MONTAGE DES LAMES ☐ Horizontales ☐ Verticales

☐ DÉCOR TÔLE Aluminium (CORBIÉRES) MOTIF Réf: DEMI LUNE ▾
☐ DÉCOR EXTÉRIEUR ☐ DÉCOR INTÉRIEUR Identique
☐ DÉCOUPE LASER Simple de la Tôle MOTIF Réf: DEMI LUNE ▾
☐ DÉCOUPE LASER Double (avec acrylique blanc)
☐ DÉCOUPE LASER Double (avec tôle dune autre couleur) RAL STANDARD _____
☐ NUMÉRO DE DOMICILE ☐ AUTRES MOTIFS RÉF _____
☐ TOTEM AVEC BOÎTE AUX LETTRES ☐ TOTEM AVEC RESERVATION B.A.L.
☐ TOTEM AVEC BOITE À COLIS CONNECTÉE

OBSERVATIONS

BON POUR ACCORD


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LUES ET ACCEPTÉES

Signature / Tampon:

OPTIONS 2


SENS D'OUVERTURE (vue ext)

☐ POUSSANT DROIT




☐ TIRANT DROIT

☐ POUSSANT GAUCHE



☐ TIRANT GAUCHE

POSE STANDARD

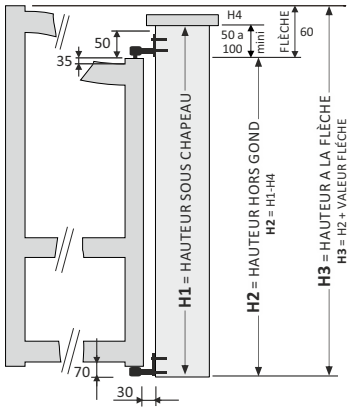

TYPE DE POSE

☐ 90º ENTRE PILIERS **(STANDARD)** ☐ OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
☐ OUVERTURE SUR PENTE (DÉNIVELÉ PAR ML) ____%
☐ 180º ARRIÈRE PILIERS ☐ 180º ENTRE PILIERS
☐ MONTAGE SUR PAUMELLES

FIXATION

☐ GONDS HAUTS AVEC CACHE-GONDS **(STANDARD)**
☐ GONDS BAS MULTIRÉGLAGE À VISSER **(STANDARD)**
☐ GONDS MULTIRÉGLAGE À VISSER HAUT ET BAS
☐ GONDS À SCELLER HAUT ET BAS
☐ CRAPAUDINE À VISSER AU SOL
☐ GONDS 3 POINTS À VISSER HAUT ET BAS

NB. DE POTEAUX (AVEC GONDS MONTÉS) à sceller

QT: _____ 100x100 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
QT: _____ 150x150 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
QT: _____ 200x200 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
QT: _____ PLATINE À VISSER POUR POTEAU 200x200 / 150x150
QT: _____ TRAPPES DE VISITE

ATTENTION : mise en fabrication et délai applicable à partir du retour du présent document (et des plans) dûment complétés et signés.
NOTE 1 : en cas de changement d'adresse pour le déchargement, la commande pourrait être livrée ultérieurement, après l'initiation de la production.
Prix valables 15 jours. Si BPA après ce délai, les prix seront actualisés selon les hausses annoncées.
